

PROJECT RENT · REPORTING OS V2 — 일반보고

일반보고 작성 가이드

L1 일일보고 → L2 주간보고 → L3 프로젝트보고
단계적으로 깊어지는 보고 체계

reporting-os-일반보고-v2.xlsx 사용 가이드 · 2026. 07 · by Project Rent

v1에서 v2로 — 무엇이 달라졌는가

v1의 원칙(6-Layer, ReportScore, ThinkingCost)은 전부 유지됩니다. 달라진 것은 **깊이**의 단계입니다.

v1 — 단일 보고 양식

일일보고와 주간보고가 하나의 엑셀에 같은 무게로 공존

5분짜리 일일보고와 수시간짜리 프로젝트 보고를 같은 틀에 담으려 했다.

v2 — 3단계 깊이

L1(5분) → L2(30분) → L3(수시간)

상황에 맞는 깊이를 선택

일일엔 L1, 주간엔 L2, 기획 보고엔 L3. 포함 관계로 점진적 확장.

v1 파일은 레퍼런스로 보존합니다. 코드표·ReportScore·교육사례는 v2에 그대로 이관됐습니다.

보고의 정의 — 변하지 않는 원칙

보고란, 상대방이 더 좋은 의사결정을 할 수 있도록 필요한 정보를 구조화하여 전달하는 행위이다.

86건

주간 보고 건수 — 양은 충분

2건

그 중 의사결정 가능했던 것


0점

전원의 decision_thinking 점수

문제는 성실성이 아닙니다. 보고에 판단 재료가 담기지 않는 구조가 문제입니다.

L1 ⊂ L2 ⊂ L3 — 포함 관계

L1의 모든 항목은 L2에 포함되고, L2의 모든 항목은 L3에 포함됩니다. 작은 보고를 잘 쓰면 큰 보고는 확장일 뿐입니다.

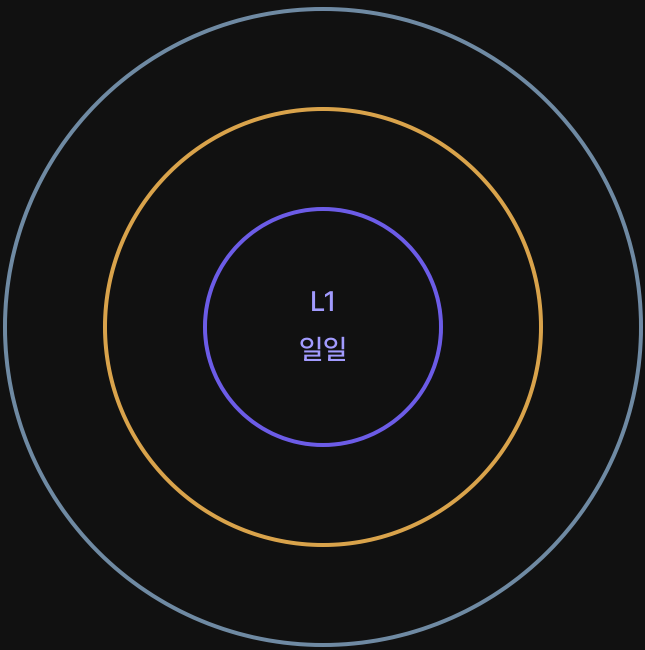

L1 일일보고

8항목 · 5~10분

매일 퇴근 전. 오늘 가장 중요한 것과 내일 계획.

L2 주간보고

L1 + 확장 · 30분

매주 금요일. 프로젝트 단위 변화 + 실패 + 배운 점.

L3 프로젝트보고

L2 + 심화 · 수시간

수시. 배경분석 + 대안비교 + 실행계획 + 의사결정 패키지.

엑셀 열 레이아웃 — 이렇게 씁니다

모든 입력 시트(L1/L2/L3)는 같은 6열 구조입니다. C열만 쓰면 되고, D~F열은 도움이 필요할 때 펼칩니다.

열	용도	서식	설명
A	섹션명	보라 배경, 볼드	6-Layer에 대응 (Context, Progress, Thinking...)
B	항목명	볼드	무엇을 써야 하는지
C	입력란	흰색, 테두리	여기에만 쓰면 됩니다
D	설명/가이드	회색 이탤릭	이 항목이 왜 필요한지, 무엇을 써야 하는지
E	잘못된 예시	코랄 배경	이렇게 쓰면 안 됨
F	좋은 예시	그린 배경	이렇게 쓰면 됨

D~F열은 접혀 있습니다


기본 상태에서는 A·B·C열만 보입니다. 가이드가 필요하면 열 그룹의 + 버튼을 눌러 펼치세요.

A~B열은 고정입니다

좌우 스크롤해도 섹션명과 항목명은 항상 보입니다.

6-Layer — 모든 보고의 뼈대

v1과 동일합니다. 모든 보고 정보는 6개 Layer 중 하나에 속합니다.

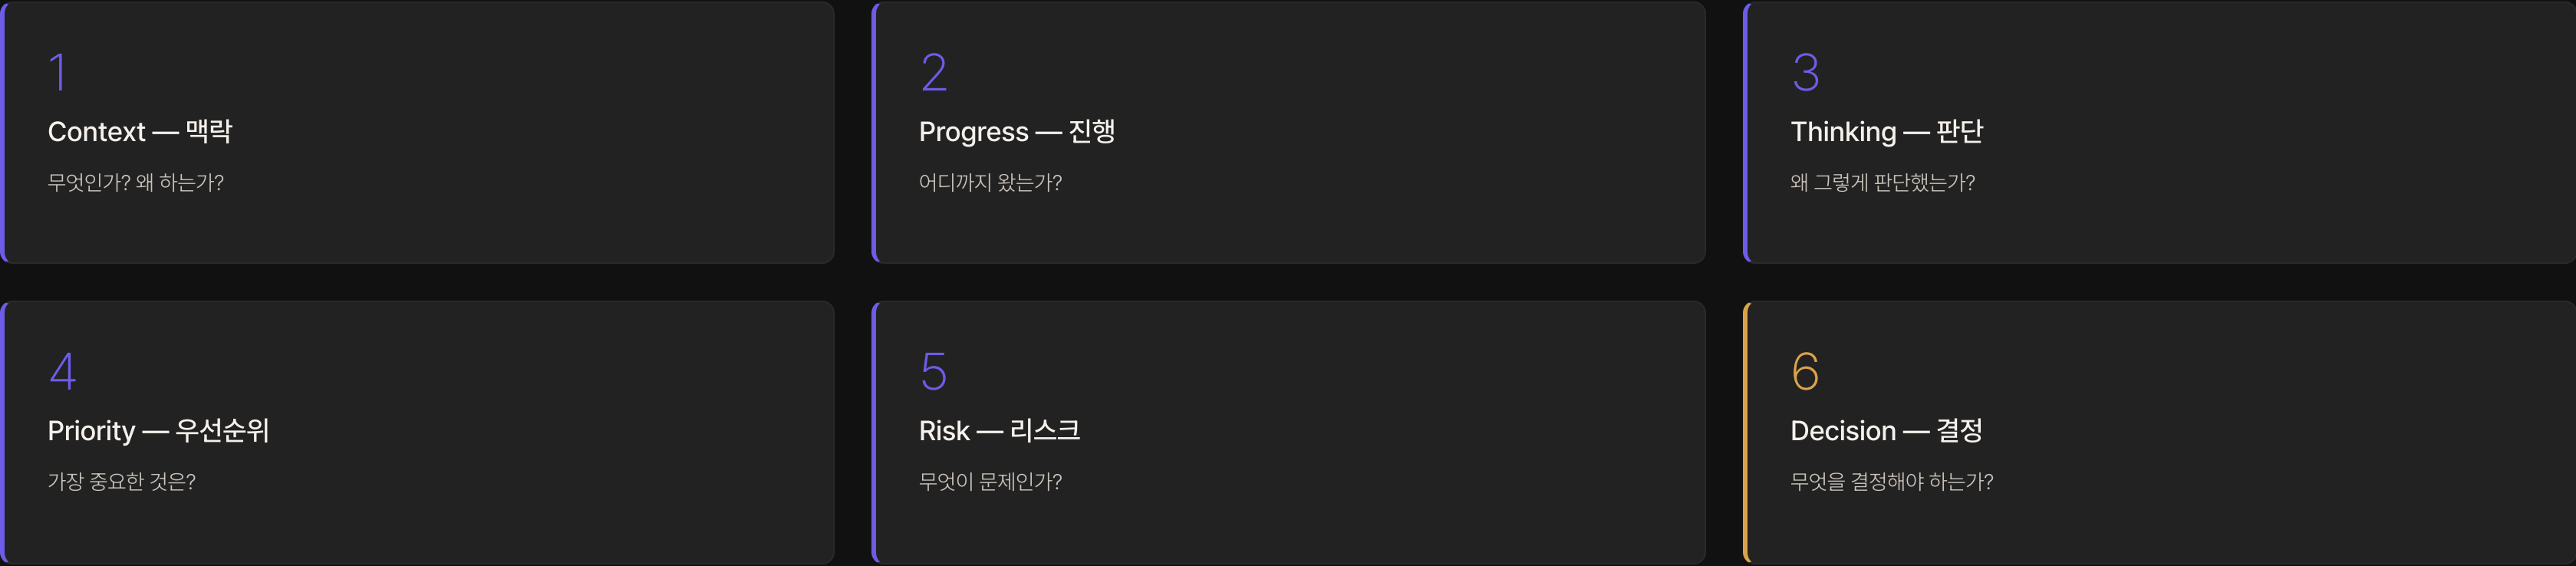

엑셀의 A열(섹션명)이 이 6-Layer에 대응합니다. 항목을 쓸 때 "이 정보가 6개 중 어디에 속하는가"를 의식하면 자연스럽게 구조화됩니다.

L1 일일보고 — 8항목, 5~10분

"오늘 한 일"이 아니라 "오늘 조직이 더 나아졌는가"를 보여줍니다. 매일 퇴근 전에 씁니다.

#	섹션	항목	핵심 질문	LAYER
1	맥락	프로젝트명	오늘 가장 집중한 프로젝트	Context
2	맥락	오늘 가장 중요한 업무	왜 중요한지 한 줄 포함	Context
3	진행	오늘 얻은 결과 (Output)	"했다"가 아니라 산출물 명사	Progress
4	판단	목표 대비 위치 (Outcome)	Output이 만든 변화와 의미	Thinking
5	판단	근거구분	사실 / 의견 / 혼합	Thinking
6	리스크	발견한 문제	사실 + 영향 + 대응. "없음" OK	Risk
7	우선순위	내일 가장 중요한 일	★로 최중요 1개 표시	Priority
8	의사결정	대표에게 필요한 것	옵션 + 추천안 + 기한	Decision

"무엇을"보다 "왜"가 먼저다

BEFORE — 실제 보고

"도면 작업 중"

어떤 프로젝트의 무슨 도면인지, 왜 오늘 이게 중요한지 알 수 없다.

AFTER

"세스크멘슬: 주방가구 도면 정리 — 내일 주방업체 미팅 자료"

프로젝트 + 무엇을 + 왜가 한 줄에 있다.

공식: [프로젝트명] : [무엇을] — [왜 / 무엇을 위해]

Output은 명사, Outcome은 변화

Output (산출물)

BEFORE	"리서치 진행함"
AFTER	"업체별 단가·제작기간·리스크·타임라인 정리표"

Output 공식: 산출물 이름 + 수량 (명사)
Outcome 공식: [산출물] → 이제 [무엇]이 가능해졌다 (목표 대비 __%)

Outcome (변화·의미)

BEFORE	"최종 연출샷" ← Output 복사
AFTER	"미팅 자료로 공유 → 업체 미팅에서 바로 논의 가능"

"컨펌 필요"는 보고가 아니다

Decision 배점 20점 — 우리 조직에서 가장 결핍된 항목이기 때문입니다.

BEFORE — 실제 보고

"대표님 컨펌 필요."

무엇을 컨펌해야 하는지 없다. 대표의 되묻기 3~4회가 예약된다.

AFTER

"공간 규모 **100평 vs 255평** · 총용역비 증액분 배분 내부 확정 필요
(설치·물류·규모에 직결) — 기한: 이번 주 수"

옵션이 있고, 왜 지금 결정해야 하는지 있고, 기한이 있다.

Decision 3요소

옵션(선택지 2개 이상) + **추천안**(내 의견과 근거) + **기한**(언제까지 필요한가)

"없음"도 판단입니다. 공란은 "생각 안 함", "없음"은 "판단한 결과".

Risk = 사실 + 예상 영향 + 대응

BEFORE — 실제 보고

"없서" · "이것도 정리" · "기억이 안나 우선 이대로 진행"

AFTER — 3요소 구조

사실	1차 시안 1개 완료 (계획 3개 대비 33%)
예상 영향	컬러 확정 2일 지연 → 발주 일정 연쇄 영향
대응	내일 오전 시안 2개 우선 작업으로 만회

조직 Risk로 승격되는 순간

같은 주에 3명이 보고한 "AI 토큰 부족" — 개별 블로커가 모이면 조직 Risk가 됩니다. 구조화된 보고만이 이 패턴을 보이게 합니다.

사실과 의견을 분리하라

원문 — 실제 보고

"오늘 클로드가 막히면서 늦게 시작했고, 토큰이 모자라서 마지막 자료를 잘 정리하지 못했어"

사실

클로드 토큰 소진으로 약 2시간 작업 중단. 신규 계정 생성 30분 소요.

의견

토큰 한도가 늘지 않으면 이번 주 반복될 것.

요청 (Support)

팀 공용 AI 토큰 확충 검토 (이번 주 내).

근거구분 드롭다운: **사실**(관찰·측정·발생한 일) / **의견**(해석·예측·제안) / **혼합**(분리 재작성 대상)

L2 주간보고 — L1 + 프로젝트 단위 확장

일일보고를 모아 붙이는 것이 아닙니다. 한 주 동안 프로젝트가 어떻게 변했는가를 설명합니다.

프로젝트별 블록 (기본 3개, 확장 가능)

#	항목	L1 대응
1	프로젝트명	= L1 프로젝트명
2	프로젝트 목표	L2 신규
3	이번 주 가장 중요한 업무	= L1 확장
4	이번 주 핵심 변화	L2 신규
5	성과 (Output + Outcome)	= L1 통합
6	근거구분	= L1
7	실패	L2 신규
8	배운 점	L2 신규
9	발견한 문제	= L1
10	다음 주 핵심 목표	= L1 확장
11	대표 의사결정 요청	= L1

왜 "실패"가 "성과"와 동급인가

실패가 기록되지 않는 조직은 같은 실패를 반복합니다.

실패 보고는 감점이 아니라 조직 학습의 원료입니다.

종합 섹션 (+2항목)

ThinkingCost 자가평가 — 이번 주 추가 질문 횟수 별점

ReportScore 자가채점 — 이번 주 평균 점수

"계속 진행 중"은 변화가 아니다

주간보고의 핵심은 **지난주 대비 무엇이 달라졌는가**를 한 문장으로 쓰는 것입니다.

BEFORE

"계속 진행 중입니다."

어디서 어디로 움직였는지 알 수 없다. 지난주 보고를 복사해도 똑같다.

AFTER

"주방업체 후보 **5곳 → 3곳** 쇼트리스트 확정"

어디서 어디로 변했는지 한 문장으로 명확하다.

공식: [이전 상태] → [현재 상태] (변화의 핵심 한 문장)

실패를 숨기면 조직이 멈춘다

실패

BEFORE

(공란 — 실패를 숨김)

AFTER

"예정 시안 3개 중 1개만 완료 (33%)
— 디자이너 일정 충돌"

배운 점

BEFORE

"다음에 잘해야지"

AFTER

"업체 비교는 견적서만으로 부족 — 현장 방문 후 판단이 30% 이상 바뀜"

배운 점의 기준: "다음에 재사용 가능한가?"

"잘해야지"는 배움이 아닙니다. "이런 상황에서는 이렇게 하면 된다"가 배움입니다. 이것이 쌓이면 조직의 지식이 됩니다.

L3 프로젝트보고 — L2 + 심화 4섹션

L2의 모든 항목을 포함하고, 아래 4개 심화 섹션이 추가됩니다.

심화 1

배경분석

Why Now — 왜 지금인가

이해관계자 맵 — P1/P2/P3 + 기대·우려

As-Is / To-Be — 현재와 목표의 갭

심화 2

심화판단

문제 정의 — 표면→근본→해결방향

대안 분석 — 옵션 비교 (최소 2개)

추천안 + 근거 — 사실과 의견 구분해서

심화 3

실행계획

마일스톤 — 날짜 + 산출물 + 의존성

예산 — 항목별, 확정/추정 구분

리스크 매트릭스 — 확률×영향 + 대응

심화 4

의사결정 패키지

결정 목록 — 이 보고에서 결정할 것 전체

승인 후 실행사항 — 누가·무엇을·언제까지

L3는 수시로 쓰는 것이 아닙니다. 프로젝트 방향성 보고, 전략 의사결정이 필요할 때 씁니다.

"A안으로 하겠습니다"는 판단이 아니다

L3의 대안 분석은 최소 2개 옵션의 장단점을 비교하고, 추천안의 근거를 사실/의견으로 구분합니다.

BEFORE

"A안으로 하겠습니다."

왜 A안인지, 다른 선택지는 무엇이었는지, 근거가 사실인지 의견인지 없다.

AFTER — 대안 비교 + 추천

옵 션	장점	단점
A안: 직영	정체성 보존 (↑)	초기 수익 불확실 (↓)
B안: 위탁	안정적 수익 (↑)	정체성 훼손 리스크 (↓)
C안: 하이브리드	균형	운영 복잡도 (↑)

추천: A안(직영) — 봉은사 정체성이 최대 자산

사실

수익은 프로그램 고도화로 보완 가능

의견

대표는 이 섹션만 보고 결정할 수 있어야 한다

BEFORE

"승인 부탁드립니다."

AFTER — 결정 목록 + 승인 후 실행

결정 항목	옵 션	추 천	기 한
① 운영방식	직영 vs 위탁 vs 하이브리드	직영	7월 말
② 예산범위	20~26억	23억 (중간)	8월 초
③ 설계사 선정	A사 / B사 / C사	A사	8월 중

승인 시 즉시 실행

① 설계사 계약 체결 (기획팀, D+3) / ② 시공사 입찰공고 (운영팀, D+7) / ③ 주민설명회 일정 확정 (대외협력, D+14)

같은 프로젝트가 L1→L2→L3로 성장하는 모습

항목	L1 (일일)	L2 (주간)	L3 (프로젝트)
맥락	봉은사: 도면 정리 — 업체 미팅 자료	+ 프로젝트 목표: 2027.Q1 리뉴얼 오픈	+ Why Now + 이해관계자 맵 + As-Is/To-Be
판단	근거구분: 사실	+ 실패 + 배운 점	+ 문제 정의 + 대안 분석 + 추천안
리스크	사실 + 영향 + 대응	= 동일	+ 리스크 매트릭스 (확률×영향)
결정	옵션 + 추천 + 기한	= 동일	+ 결정 목록 + 승인 후 실행사항

L1을 잘 쓰는 사람은 L2를 쓸 때 확장만 하면 됩니다. L2를 잘 쓰는 사람은 L3에서 심화만 추가하면 됩니다. 기본기가 전부입니다.

쓰기 전에, 스스로 묻는 6가지

좋은 보고는 좋은 질문에서 시작됩니다.

☐ 이 프로젝트의 **성공 기준** 은 무엇인가?

☐ 이번 업무에서 가장 중요한 **Deliverable** 은 무엇인가?

☐ 내가 쓴 문장은 **사실인가, 의견인가** ? 섞이지 않았는가?

☐ 대표가 이 보고를 보면 **무엇을 결정** 해야 하는가?

☐ 이 프로젝트가 실패한다면 **가장 큰 이유** 는 무엇인가?

☐ 그 문제를 해결하는 **가장 비용이 적은 방법** 은 무엇인가?

보고 품질 100점 — 제출 전 1분

글을 잘 썼는가가 아니라, 의사결정을 잘하게 만드는가를 켡니다.

항 목	배 점	만 점 기 준
맥락	20	프로젝트명 + 왜가 있다
목표 명확성	10	목표 대비 % 또는 성공 기준
근거	15	사실/의견 구분
우선순위	15	★ 최중요 표시
리스크	10	사실+영향+대응
결정 요청	20	옵션+추천+기한
지원 요청	10	무엇·언제까지·왜

엑셀 ReportScore 시트 사용법

1. 각 항목에 O/X 체크
2. 득점이 자동 계산됨
3. 합계가 오늘의 Report Score

"없음" 득점 규칙

Risk·Decision·Support는 "없음" 명시해도 O.
공란 = 생각 안 함 (X). "없음" = 판단 결과 (O).

좋은 보고 = 추가 질문이 없는 보고

보고의 KPI는 완료율이 아니라 **추가 질문 감소율**입니다.

추가 질문 수	별 점	의미
0개	★★★★★	보고만으로 판단 완결
1~2개	★★★★	거의 완결, 디테일 보완
3~4개	★★★	근거·옵션 부족
5개	★★	생각을 덜 했다
6개 이상	★	업무일지 수준

측정 방법

대표·팀장이 보고 확인 후 추가 질문 수를 ReportScore 시트 하단 '일별 기록'에 기입합니다.

ARISA 봇의 완결성 질문은 **훈련**이므로 세지 않습니다. 사람 상급자의 되묻기만 셉니다.

엑셀 시트 구성 — 7개 시트

시트	용도	작성 시간	주기
00-안내	전체 구성 설명, 색상 규칙, 포함 관계	—	참조
01-코드표	6-Layer, ReportScore 배점, ThinkingCost 정의, 드롭다운 원천	—	수정 금지
L1-일일보고	매일 업무 보고 — 8항목	5~10분	매일 퇴근 전
L2-주간보고	주간 성과·리스크·의사결정 — 프로젝트×11항목 + 종합 2항목	30분	매주 금요일
L3-프로젝트보고	전략·프로젝트 심화 — L2 + 심화 4섹션 11항목	수시간	수시
작성예시	실제 데이터 기반 Before→After + 잘 쓴 보고 실례	—	참조
ReportScore	보고 품질 100점 자가채점 + ThinkingCost 일별 기록	1분	매일 제출 직전

어떤 레벨로 쓸지 — 선택 기준

L1

일일보고

매일 퇴근 전

5~10분

오늘 한 일의 핵심과 내일 계획을 전달할 때

→ 기본. 매일 쓴다.

L2

주간보고

매주 금요일

30분

프로젝트의 주간 변화·실패·배운 점을 정리할 때

→ 프로젝트가 움직이고 있을 때.

L3

프로젝트보고


수시

수시간

프로젝트 방향성·전략적 의사결정이 필요할 때

→ 큰 결정이 필요할 때만.

보고는 끝이 아니라, 조직 지식의 최소 단위

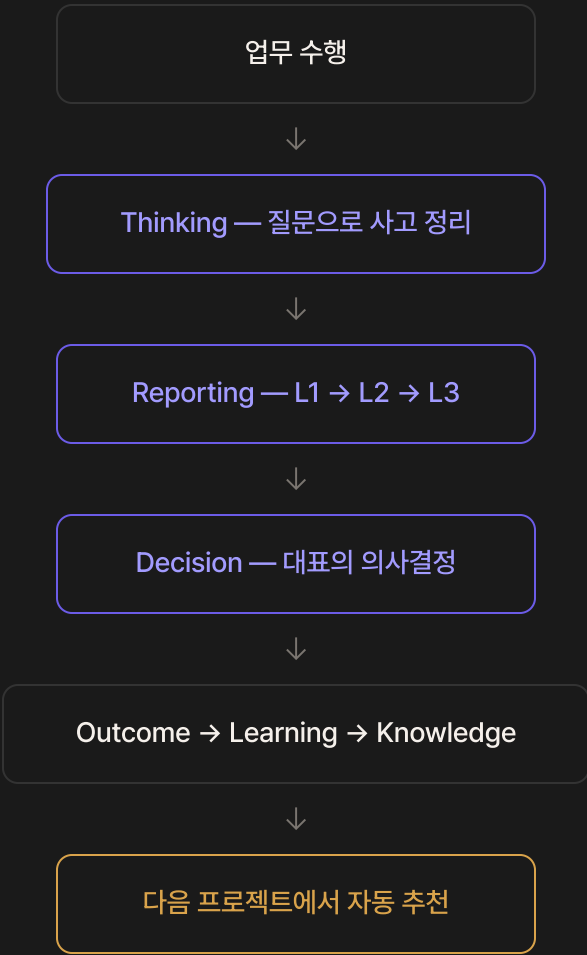

일반보고 v2의 범위

Thinking → Reporting → Decision 구간. L1(매일)·L2(매주)·L3(수시)로 상황에 맞는 깊이를 선택합니다.

기획안보고와의 관계

일반보고는 진행 중인 업무를 보고합니다. 새로운 프로젝트/사업을 제안할 때는 기획안보고 엑셀(1P Brief → 5P Concept → 10P Master)을 씁니다.

CLOSING

L1을 잘 쓰면
L2는 확장, L3는 심화.
기본기가 전부입니다.

내일부터:

1. L1 엑셀로 일일보고 작성 — C열에만 쓰면 됩니다
2. 제출 전 ReportScore 시트 1분 체크
3. Decision·Support에 "없음"까지 명시
