

BONGEUNSA CULTURAL CENTER · PROJECT SCHEDULE V3

봉은문화회관 활용전략 용역 프로젝트 일정 · 업무 프로세스

계약 90일(05.18~08.16)을 앞단 압축으로 설계 — 조사 스프린트 → 6월말 중간보고 → 7/2 방향성 확정 → 8/14 최종 납품. 크리티컬 패스를 앞단 21일에 집중시킨 프론트로디드 일정.

발주 / 수행

대한불교조계종 봉은사 · Project Rent

계약


5,000만원 · 90일

기준일

2026.06.11 (v3)

앞단을 압축해 6월말 방향을 확정한다

90일 중 앞 21일(조사 스프린트 → 중간보고 → 방향성 확정)이 크리티컬 패스. 이 구간만 지키면 7~8월 마스터플랜·제작은 여유 있게 흐른다.



크리티컬 패스. 조사 스프린트(6/11-19) → M2 중간보고(6/20-25) → M3 방향성 확정(7/2). 이 9~21일 구간이 전체 일정의 임계경로다.

출처: 봉은문화회관 활용전략 영역 — 전체 프로젝트 타임라인 v3 (Front-loaded), 2026.06.11.

중간보고 전, 9일 안에 조사를 끝낸다

리서치·인터뷰·시장조사를 9일에 압축. 설계 → 실시 → 분석 3단계를 3트랙 동시 진행해 대안 3안 방향까지 도출한다.

6/11-13 · 설계

조사 설계

인터뷰 가이드 + 설문 문항 + 시장조사 프레임 확정. 대상자 명단·신도DB·설문 채널 협조 요청.

6/14-18 · 실시

인터뷰 · 설문 · 시장조사

이해관계자 인터뷰(주지·종무·신도화·운영) + 방문객/신도/MZ/외국인 온라인 설문 + 경쟁·벤치마크 시장조사.

6/18-19 · 분석

1차 인사이트


조사 결과 속성 분석 → 공간 대안 3안 방향 도출. 중간보고 자료화.

스프린트 성패. 인터뷰 대상자 섭외·신도DB·설문 채널을 6/12 킥오프에서 즉시 확정하느냐가 9일 스프린트의 관건. 온라인 설문 병행으로 회수 속도를 확보한다.

출처: 프로젝트 타임라인 v3 · 조사 스프린트 섹션.

네 번의 의사결정 게이트


이해관계자 미팅·PT를 4개 마일스톤으로 배치해 단계마다 공감대와 결정을 확보한다. 그 사이를 진단 → 조사 → 대안 → 마스터플랜 → 제작의 작업 흐름이 잇는다.

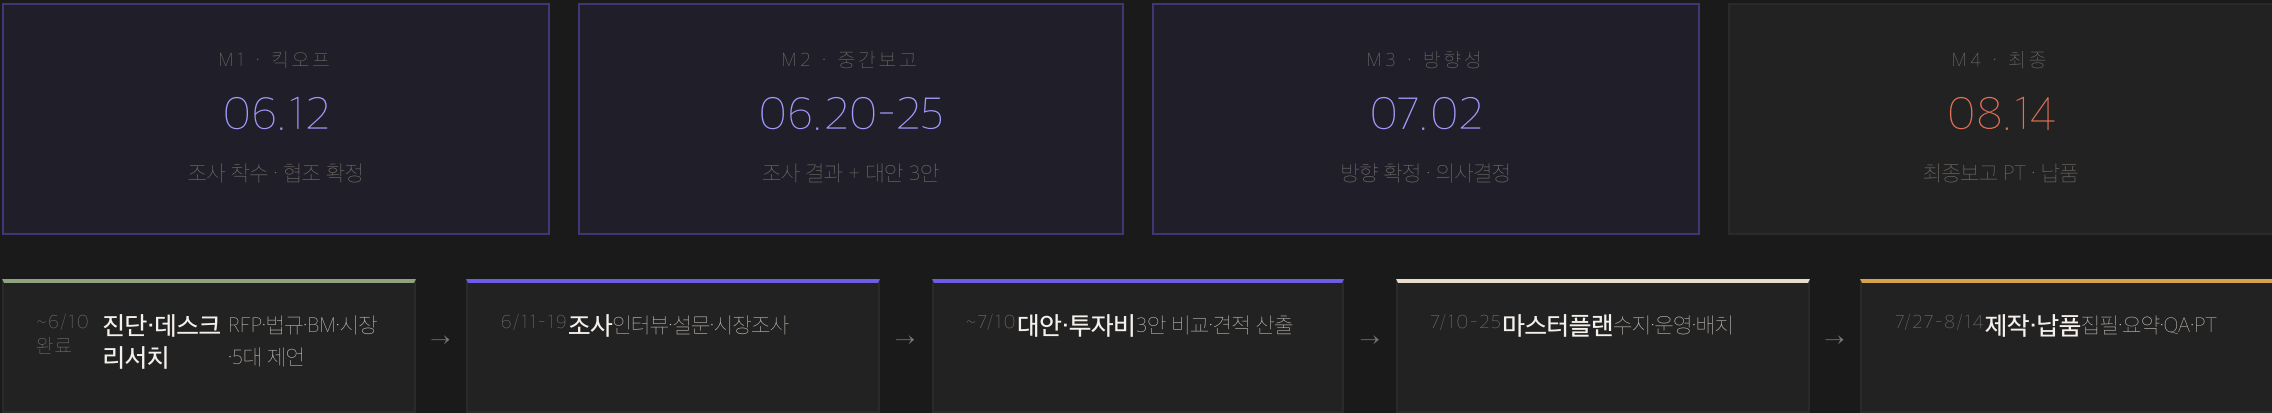

출처: 프로젝트 타임라인 v3 · 마일스톤 간트.

계약 90일을 한 장으로 본다

5/18 착수 → 8/16 마감. 진단·데스크리서치는 완료, 지금은 조사 스프린트 → 대안·투자비 산출 구간 — 6월 말 중간보고와 7/2 방향성 확정이 크리티컬 패스다.

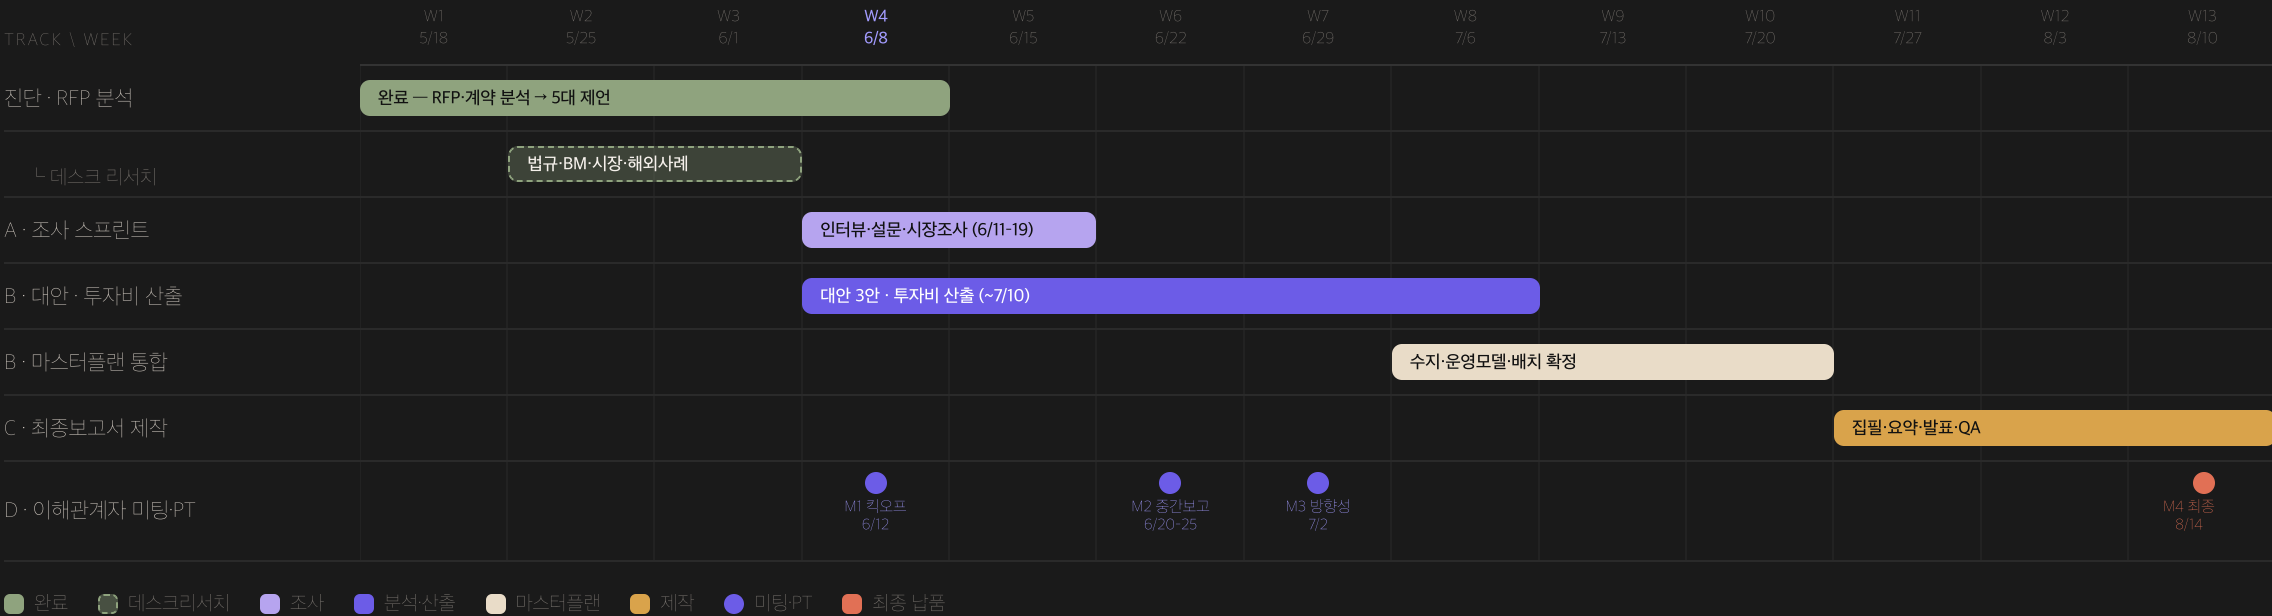

출처: 프로젝트 타임라인 v3 (Front-loaded) · 마일스톤 간트. 크리티컬 패스 = 조사(6/11-19) → 중간보고(6/20-25) → 방향성(7/2).

전반부 — 진단 완료, 조사 착수

착수~6월말. 진단·데스크리서치·통합제언은 완료됐고, 이제 조사 스프린트와 중간보고가 핵심 과업이다.

기간	단계	핵심 과업	산출물 / 마일스톤
5/18-5/24	완료	착수 + RFP·계약서·과업지시서 분석	RFP 분석 리포트 
5/25-6/7	완료	데스크 리서치 — 법규·세법, 종교공간 BM, 해외사례, 상권·삼성동 개발	법규 가이드·BM 팩트시트·리서치군 
6/8-6/10	완료	5대 공간활용 제언 통합·정리	통합제언 보고서 
6/12-13	◆ M1	킵오프 — 조사 착수, 인터뷰 대상자·신도DB·설문 채널 협조 확정	킵오프 합의·조사 협조
6/11-6/19	스프린트	빠센 조사 9일: 인터뷰·설문·시장조사 + 대안 3안 초안	조사 설계서·인터뷰 로그·설문 1차·대안 초안
6/20-6/25	◆ M2	중간보고 PT — 조사 결과 + 공간 대안 3안, 공감대 형성·1차 피드백	중간보고서 + PT

출처: 프로젝트 타임라인 v3 · 주차별 실행계획(전반).

후반부 — 방향 확정 후 마스터플랜·제작

7/2 방향성 확정을 기점으로 대안·투자비 산출 → 마스터플랜 통합 → 최종보고서 제작이 순차로 진행된다.

기간	단계	핵심 과업	산출물 / 마일스톤
6/26-7/1	조정	중간보고 피드백 반영, 방향(안) 압축·확정 자료화	방향성 보고 자료
7/2	◆ M3	방향성 보고 — 추진 방향(안) 확정 / 의사결정, 마스터플랜 착수 기준 확보	방향 확정
7/3-7/10	산출	대안 3안·투자비 최종 산출 확정 (리모델링 범위·건적 포함)	대안 비교표 · 투자비 산정서
7/10-7/25	마스터플랜	5개년 수지분석, 운영모델(직영/위탁/하이브리드), 공간 배치, 추진 로드맵, 인허가·유권해석 제언	마스터플랜 본문
7/27-8/9	제작	최종보고서 집필·요약·발표자료, 검수 체크리스트(45항목) 내부 QA	최종보고서·요약·발표 + QA
8/10-8/14	◆ M4	최종보고 PT + 납품, 교정·인쇄·USB	5부 + 요약 5부 + USB 5개 + 발표

출처: 프로젝트 타임라인 v3 · 주차별 실행계획(후반).
